



## Open Project v1.4 – Curso Básico

### PRACTICA


### Recursos

El objetivo es crear en Open Project v1.4 el cronograma para el proyecto “Cartera de Proyectos en Project Server”, a partir de la EDT y la información de recursos suministrada.

- ❖ Lea todo el enunciado antes de empezar la práctica.
- ❖ Desarrolle los requerimientos de la práctica paso a paso.

#### Requerimientos

1. Modificar la fecha de inicio del proyecto al:
  - 16 de Setiembre del 2013.
2. Pase la siguiente EDT a Open Project v1.4.
  - Coloque la información de la caja del primer nivel como Título del proyecto.
  - Las cajas del segundo nivel representan fases.
  - La información asociada a cada fase corresponde a sus subtareas.

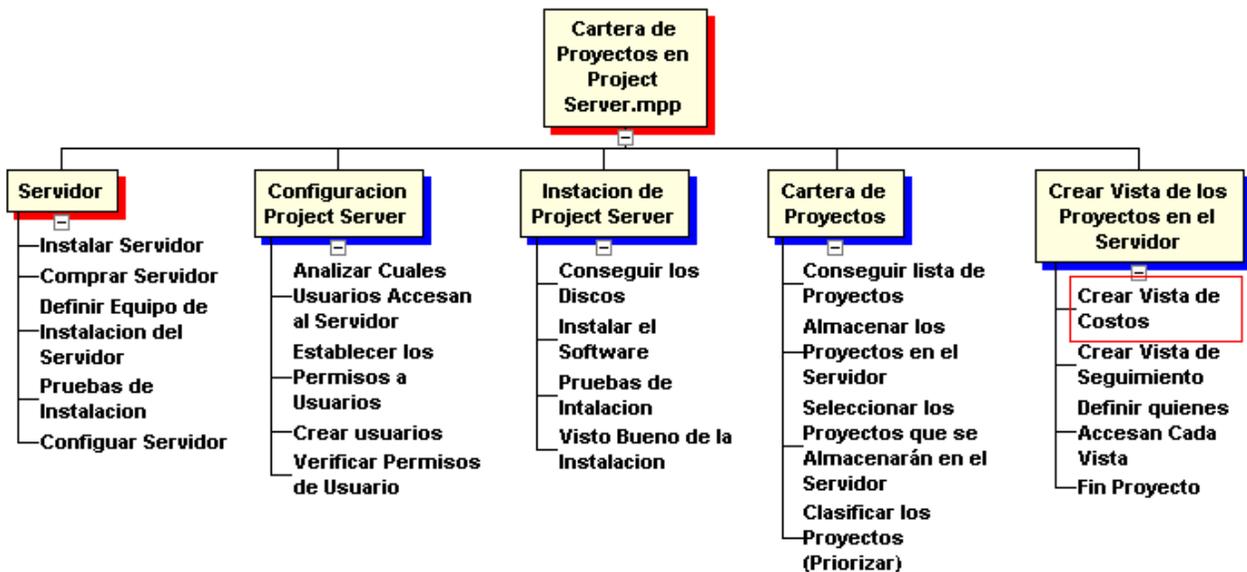



3. Configure la Tarea Resumen del proyecto con el nombre del proyecto como descripción.

4. Incluya las siguientes duraciones al cronograma:

- ❖ Las tareas que están en negrita y no tienen duración representan fases.
- ❖ Las tareas que tienen una duración de 0 días son hitos.

#	Nombre de la actividad	Duración
1	<b>Servidor</b>	
2	Instalar Servidor	1 día
3	Comprar Servidor	4 días
4	Definir Equipo de Instalación del Servidor	1 día
5	Pruebas de Instalación	2 días
6	Configurar Servidor	2 días
7	<b>Configuración Project Server</b>	
8	Analizar Cuales Usuarios Accesan al Servidor	1 día
9	Establecer los Permisos a Usuarios	1 día
10	Crear Usuarios	1 día
11	Verificar Permisos de Usuario	2 días
12	<b>Instalación de Project Server</b>	
13	Conseguir los Discos	1 día
14	Instalar el Software	2 días
15	Pruebas de Instalación	1 día
16	Visto Bueno de Instalación	1 día
17	<b>Cartera de Proyectos</b>	
18	Conseguir Lista de Proyectos	2 días
19	Almacenar los Proyectos en el Servidor	1 día



20	Seleccionar los Proyectos que se Almacenarán en el Servidor	1 día
21	Clasificar los Proyectos (Priorizar)	1 día
22	<b>Crear Vista de los Proyectos en el Servidor</b>	
23	Crear Vista de Costos	1 día
24	Crear Vista de Seguimiento	1 día
25	Definir Quienes Accesan Cada Vista	1 día
26	Fin Proyecto	0 días

5. Establezca las siguientes dependencias entre tareas\ fases:

- ❖ Para establecer la dependencia de las tareas, se considera la cronología lógica de ejecución de las fases y las tareas.
  - ❖ Respete el orden establecido de la EDT (no cambie de lugar ninguna actividad).
- a) La actividad “Comprar Servidor” tiene un tipo de relación Comienzo-Comienzo con la actividad “Definir Equipo de Instalación del Servidor”.
  - b) Una vez que hayan concluido las tareas “Comprar Servidor” y “Definir Equipo de Instalación del Servidor” se procede a instalar el servidor, luego se configura y por último se realizan las pruebas.
  - c) Las siguientes tareas tienen el tipo de relación **FS**:
    - Conseguir los Discos
    - Instalar el Software
    - Pruebas de Instalación
    - Visto Bueno de la Instalación
  
    - Crear Vista de Costos
    - Crear Vista de Seguimiento
    - Definir Quiénes Accesan Cada Vista
    - Fin Proyecto
  - d) En la Configuración del Project Server primero se analiza cuales usuarios accesan el servidor, luego se crean los usuarios, se establecen los permisos y por último se verifican estos permisos.



- e) Para configurar la Cartera de Proyectos, se debe conseguir primero la lista de proyectos, luego se selecciona cuáles de ellos se almacenarán, se procede a priorizarlos y por último se almacenan en el servidor.
  - f) En este proyecto primero se realiza la fase “Servidor”, luego la fase relacionada con la instalación del Project Server, luego la relacionada con configuración. Una vez configurado el software, se levanta la cartera de proyectos en el servidor y, por último, se procede con la fase relacionada con la creación de vistas de los proyectos.
6. Establezca “Visto Bueno de la Instalación” **como un hito** (debe respetar su duración de 1 día).
7. Defina los siguientes **recursos** en la vista Recursos:
- ❖ El encabezado suministrado corresponde al valor a colocar en la columna “Grupo” para cada conjunto de recursos.

***Equipo Instalación del Servidor***

Javier Prado  
Mariana Sintek

***Equipo Configuración Project Server***

Ingeniero 1 Microsoft

***Equipo Instalación Project Server***

Katrina Ovares  
Ingeniero 2 Microsoft

***Equipo Cartera Proyectos***

David Sáenz  
Félix Torres

***Equipo Vista de los Proyectos***

Ingeniero 3 Microsoft



8. Asigne los recursos a las tareas de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de la actividad	Recurso
<b>Servidor</b>	
Instalar Servidor	Mariana Sintek
Comprar Servidor	
Definir Equipo de Instalación del Servidor	Javier Prado
Pruebas de Instalación	Javier Prado
Configurar Servidor	Javier Prado
<b>Configuración Project Server</b>	
Analizar Cuales Usuarios Accesan al Servidor	Ingeniero 1 Microsoft
Establecer los Permisos a Usuarios	Ingeniero 1 Microsoft
Crear Usuarios	Ingeniero 1 Microsoft
Verificar Permisos de Usuario	Ingeniero 1 Microsoft
<b>Instalación de Project Server</b>	
Conseguir los Discos	Katrina Ovares
Instalar el Software	Katrina Ovares
Pruebas de Instalación	Ingeniero 2 Microsoft
Visto Bueno de Instalación	
<b>Cartera de Proyectos</b>	
Conseguir Lista de Proyectos	Félix Torres
Almacenar los Proyectos en el Servidor	David Sáenz
Seleccionar los Proyectos que se Almacenarán en el Servidor	Félix Torres
Clasificar los Proyectos (Priorizar)	David Sáenz
<b>Crear Vista de los Proyectos en el Servidor</b>	
Crear Vista de Costos	Ingeniero 3 Microsoft
Crear Vista de Seguimiento	Ingeniero 3 Microsoft
Definir Quienes Accesan Cada Vista	Ingeniero 3 Microsoft
Fin Proyecto	



9. Digite el correo electrónico de cada recurso:

Nombre del Recurso	Correo Electrónico
Javier Prado	jprado@project.com
Mariana Sintek	masi@project.com
Ingeniero 1 Microsoft	ing-uno@project.com
Katrina Ovares	kaov@project.com
Ingeniero 2 Microsoft	ing-dos@project.com
David Sáenz	dasa@project.com
Félix Torres	feto@project.com
Ingeniero 3 Microsoft	ing-tres@project.com




## Resultados esperados

- A continuación se muestra un resumen de la información que debe reflejar el proyecto:

	🔍	Nombre	Duración	Inicio	Terminado
1		☐ Cartera de Proyectos en Project Server	27 days	16/09/13 08:00 AM	22/10/13 05:00 PM
2		☑ Servidor	9 days	16/09/13 08:00 AM	26/09/13 05:00 PM
8		☑ Configuración Project Server	5 days	4/10/13 08:00 AM	10/10/13 05:00 PM
13		☑ Instalación de Project Server	5 days	27/09/13 08:00 AM	3/10/13 05:00 PM
18		☑ Cartera de Proyectos	5 days	11/10/13 08:00 AM	17/10/13 05:00 PM
23		☑ Crear Vista de los Proyectos en el Servidor	3 days	18/10/13 08:00 AM	22/10/13 05:00 PM

- A continuación se muestra el Diagrama de Gantt del cronograma:

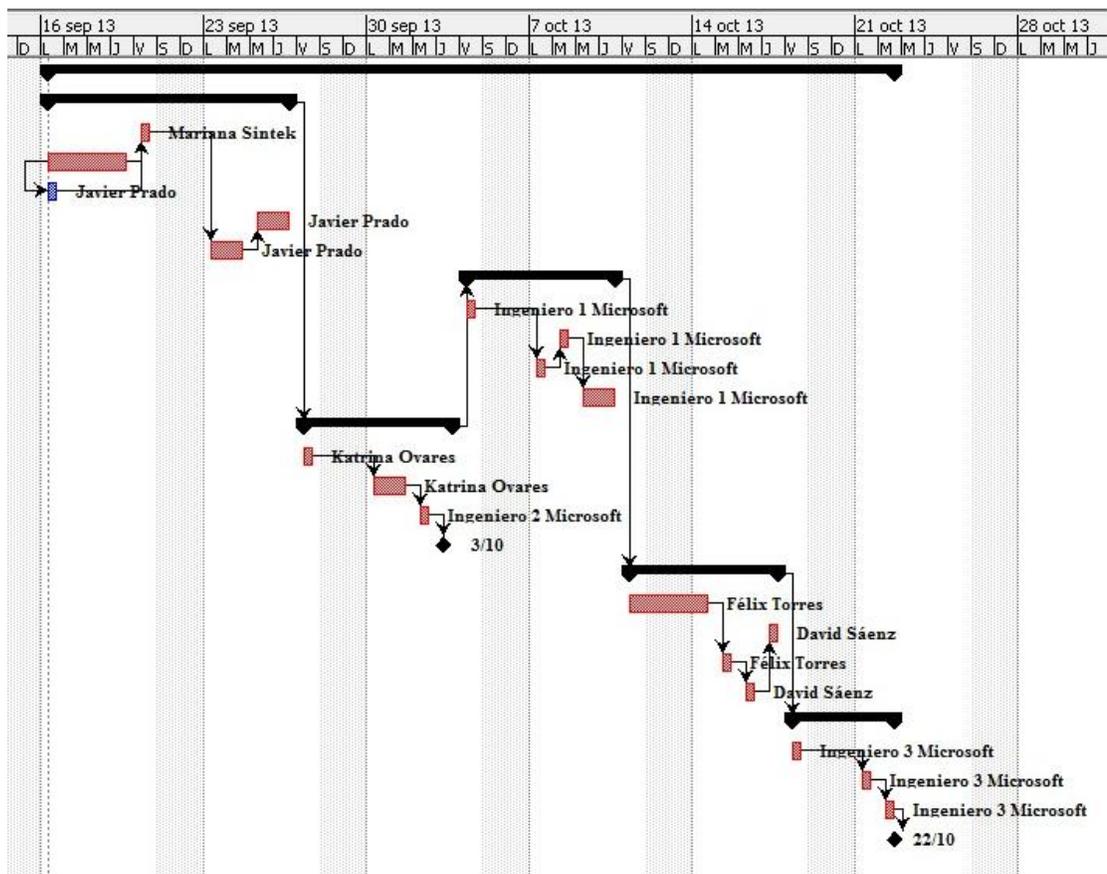

---- Fin de Práctica ----
